



001161

Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura

# Estado de avance, para reportar a la AND, Mayo-Julio 2021 proceso de diseño de la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector Silvoagropecuario (PANCC SAP)

Lunes 02 de agosto 2021

# Antecedentes PANCC SAP

001162

## Marco Lógico PANCC SAP

**Resultado 1.** Establecimiento de la gobernanza y coordinación institucional regional.

**Resultado 2.** Procesos participativo y de estimación de costos.

**Resultado 3.** Coherencia con política pública y documento PANCC SAP.

**Resultado 4.** Estrategia de financiamiento.

**Resultado 5.** Sistema de seguimiento y monitoreo.


# Antecedentes PANCC SAP

001163

## PROCESO COMPLETO ACTUALIZACIÓN PANCC SAP

### PRODUCTOS PRINCIPALES 2020-2022

Orden cronológico

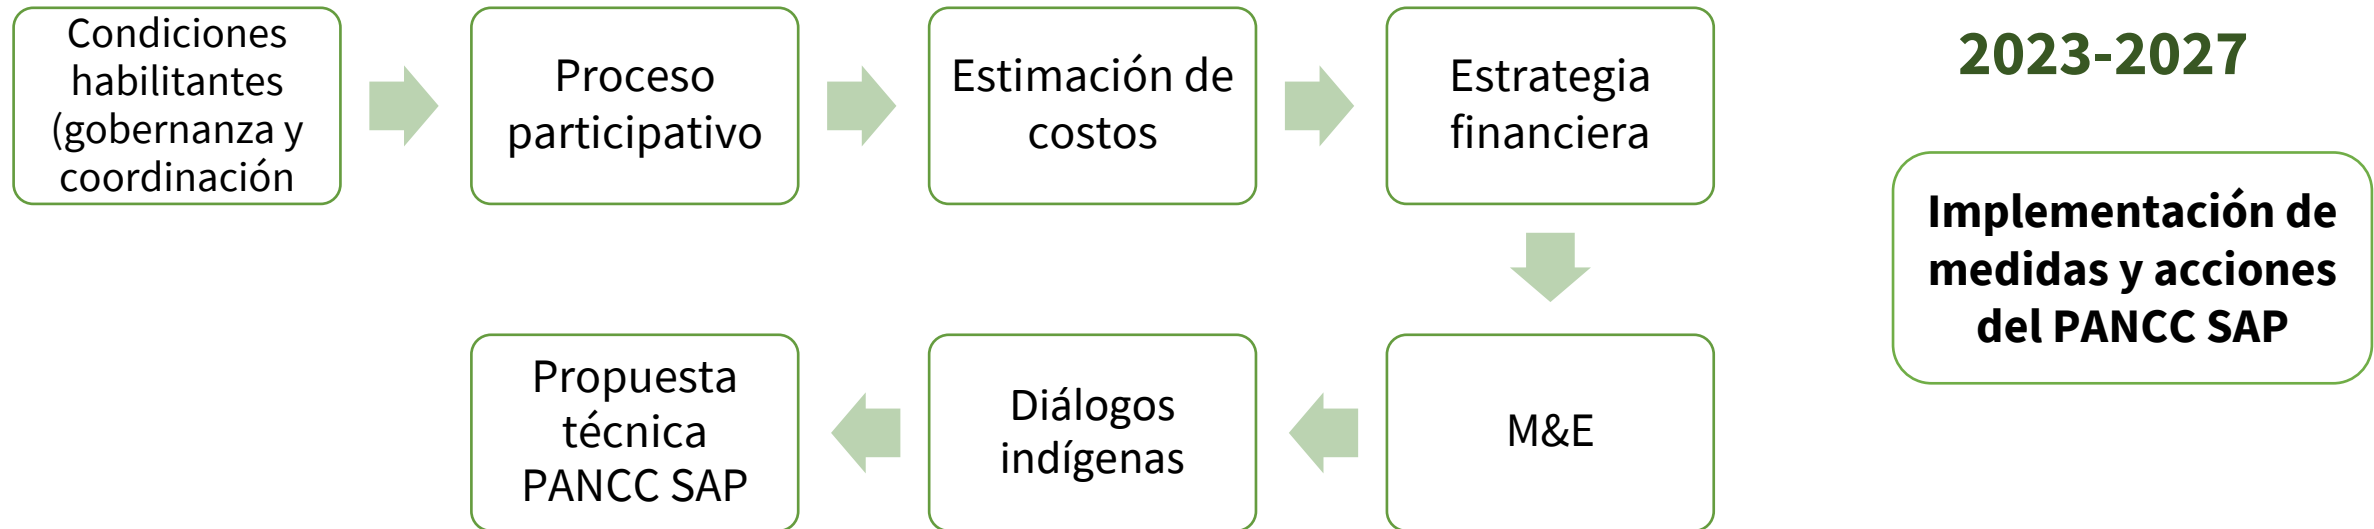

# Antecedentes PANCC SAP

001164

## Cronograma de trabajo PANCC SAP

Consultor	Proceso	2023												2024							
		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
C1	Levantamiento base de datos				2																
C2	(45/30)Talleres participativos regionales				30						28										
C3	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental																				
C4	Plan piloto de Aysén																				
C7	Estimación de costos Estrategia financiera																				
C8	Seguimiento y monitoreo																				
EC o C 9	Diálogos indígenas																				
EC	Consulta ciudadana participativa																				
C6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027																				
C5	Información agroclimática																				
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP																				
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027																				
	Impresiones PANCC SAP																				
														Plazo adicional							
														4							

# Estado de actividades del Marco lógico

001165

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
Resultado 1: Establecimiento de la gobernanza y la coordinación de la planificación de la adaptación	Sub-resultado 1.1: Elaboración del mandato y estrategia subnacional para la planificación de la adaptación en los procesos del sector Silvoagropecuario	Actividad 1.1.1: Discutir la planificación del sistema de gobernanza sectorial subnacional y acordar el mandato de la estructura de gobernanza.	Completada
		Actividad 1.1.2: Validar a nivel regional los puntos focales técnicos regionales y los lineamientos o prioridades regionales (entregados en 1.1.1) para la planificación de la adaptación al cambio climático.	Completada
	Sub-Resultado 1.2: Arreglos institucionales para apoyar los procesos de planificación de la adaptación	Actividad 1.2.1: Identificar las brechas de capacidad institucional necesarias para apoyar la planificación de la adaptación sectorial, incluidas las necesidades en materia de capacitación, género y desarrollo de la capacidad.	Completada
		Actividad 1.2.2: Sobre la base de la evaluación de las brechas institucionales en la actividad 1.2.1, elaborar una estrategia o un plan de trabajo para llenar los vacíos institucionales a fin de apoyar su capacidad de planificación y ejecución de la adaptación al cambio climático.	Completada El plan de capacitaciones ya se está ejecutando. Se realizó la primera capacitación en institucionalidad climática en diciembre 2020, y se está realizando el curso de Gestión de riesgos climáticos vinculados al sector silvoagropecuario (primera versión, con una segunda versión en agosto). Y además se inició el curso de Cambio climático en las NDC y transparencia.
		Actividad 1.3.1: Diseñar el proceso participativo subnacional.	Completada
	Sub-Resultado 1.3: Proceso de participación de los grupos de interés diseñado para asegurar su participación.		

# Actividades del Marco lógico

001166

Resultado	Sub.resultado	Actividad	Estado
<b>Resultado 2:</b> Fortalecimiento de la justificación de las inversiones para la vulnerabilidad y la adaptación al clima	<b>Sub-Resultado 2.1:</b> Identificación y priorización de las barreras para abordar las vulnerabilidades del cambio climático en el sector forestal, agrícola y ganadero.	<b>Actividad 2.1.1:</b> Implementar el proceso participativo a nivel subnacional y comprometerse con los interesados directos asociados.	En desarrollo. -Ya se cuenta con la base de datos de actores a invitar. -Se está en proceso de contratación de la empresa que hará el proceso.
	<b>Sub-Resultado 2.2:</b> Marco de análisis de costos para el contexto nacional para analizar los impactos y las vulnerabilidades, y priorizar las soluciones de adaptación	<b>Actividad 2.2.3:</b> Establecer los indicadores y ponderaciones ambientales, sociales, económicos, de género, de pueblos indígenas y otros indicadores de selección; y utilizarlos para priorizar las medidas de adaptación al cambio climático actualizadas en el plan de adaptación.	En desarrollo. -Ya se cuenta con la metodología que se usará para el análisis de priorización de medidas. -Se contrató al consultor que estará a cargo de la actividad.
	<b>Sub-Resultado 2.3:</b> Mecanismo para revisar y actualizar periódicamente el plan de adaptación establecido teniendo en cuenta consideraciones ambientales, sociales, económicas, de género y de los pueblos indígenas.	<b>Actividad 2.3.2:</b> Analizar las fuentes de información y los sistemas existentes relacionados con la gestión y actualización de la información climática vinculada al sector forestal, agrícola y ganadero.	En desarrollo. -Ya se cuenta con una investigación documental sobre información agroclimática, que servirá de insumo para la actividad.

# Otros:

001167

## **1. Proceso participativo**

- Se ha tenido que reprogramar el inicio del proceso participativo, luego de que se tuvo que terminar el contrato de la empresa que había sido seleccionada anteriormente debido a su bajo desempeño. Posterior a eso se re-definió el proceso, dividiéndolo en más consultorías y se inició la publicación de la licitación, y se seleccionó una empresa que cumplía con los requisitos técnicos y financieros. Sin embargo, debido a una demora en los procesos administrativos de FAO, la contratación de la empresa se retrasó, lo cual significó postergar el inicio del proceso participativo en 1 mes para iniciar el trabajo de planificación el 2 de agosto y los talleres participativos el 30 de agosto de 2021.

## **2. Plan Piloto Aysén**

- Se enviaron los TDR a FAO el 21 de Julio para ser publicados; se encuentran en proceso de publicación. Debido a las preocupaciones expresadas por la autoridad sectorial en la región (Seremi de Agricultura), ante la contingencia sanitaria y el nivel de participación de los/as agricultores, se decidió postergar el inicio de los talleres presenciales hasta noviembre-diciembre de 2021.

## **3. Asistente PANCC SAP**

- Se realizó el proceso de selección de la nueva asistente, dado que la anterior renunció por una mejor oferta laboral. A partir del 2 de agosto comenzará a trabajar la nueva Asistente del PANCC SAP, Blanca Torres.

## **4. Interim Progress Report (IPR) para el Fondo Verde del Clima**

- El IPR para reportar las actividades realizadas entre marzo y junio 2021 fue enviado al FVC para su revisión, con la firma del Punto Focal de la NDA.

## **5. Revisión presupuestaria**

- Se realizó una revisión y reordenamiento del presupuesto del PANCC SAP, debido a los últimos cambios. Esta decisión y reasignación ya fue aprobada por el Comité Directivo del PANCC SAP. Se están preparando los documentos oficiales para hacer el envío al FVC, previo VB de la NDA.
