

Plan Operativo Anual (POA) 2022

2ª reunión ordinaria Comité Directivo

PANCC SAP

21 Enero 2022



GREEN
CLIMATE
FUND






I. Contexto general



Línea de tiempo PANCC SAP

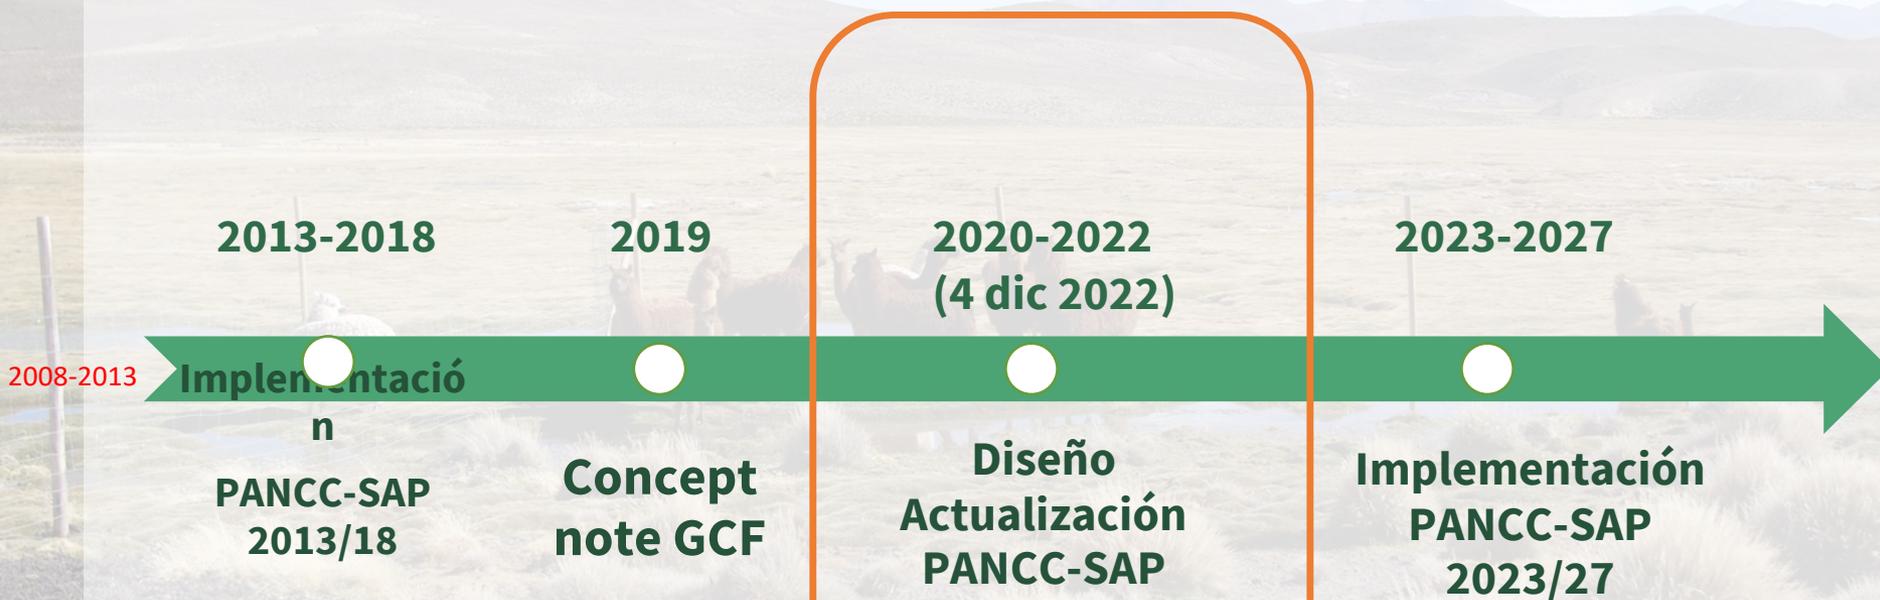

Diseño PANCC SAP (2020-2022)

Implementación PANCC SAP 2023-2027

- Monto USD 500.000 readiness GCF mediante postulación (concept note)
- 1er Plan en actualizarse
- Inicio entre proceso oficial GCF (Project agreement) e ingreso real de fondos (4 dic 2019)
- Incorpora y considera:
 - Directrices específicas CMNUCC, GCF, MMA, etc.
 - Lecciones aprendidas PANCC SAP 2013-2018
 - Salvaguardas sociales y ambientales
- Se realiza mediante Proceso participativo
- Foco en implementación en el territorio
- Definición de principales productos del Plan

Etapas del proceso de actualización

Priorización técnica de medidas y acciones

002230



2021 -2022

Proceso participativo: priorización medidas por región y macrozona (5)+ Aysén

2022

Factibilidad técnica (Minagri no Minagri/Macrozona y nivel central)

Factibilidad medición/cuantificación resultados
Sistema de monitoreo y evaluación para la implementación del Plan (métrica)

Factibilidad económica y financiera


Diálogo participación indígena

Consulta y participación ciudadana

Aprobación autoridades (MINAGRI y CMS)



Proceso de actualización PANCC SAP

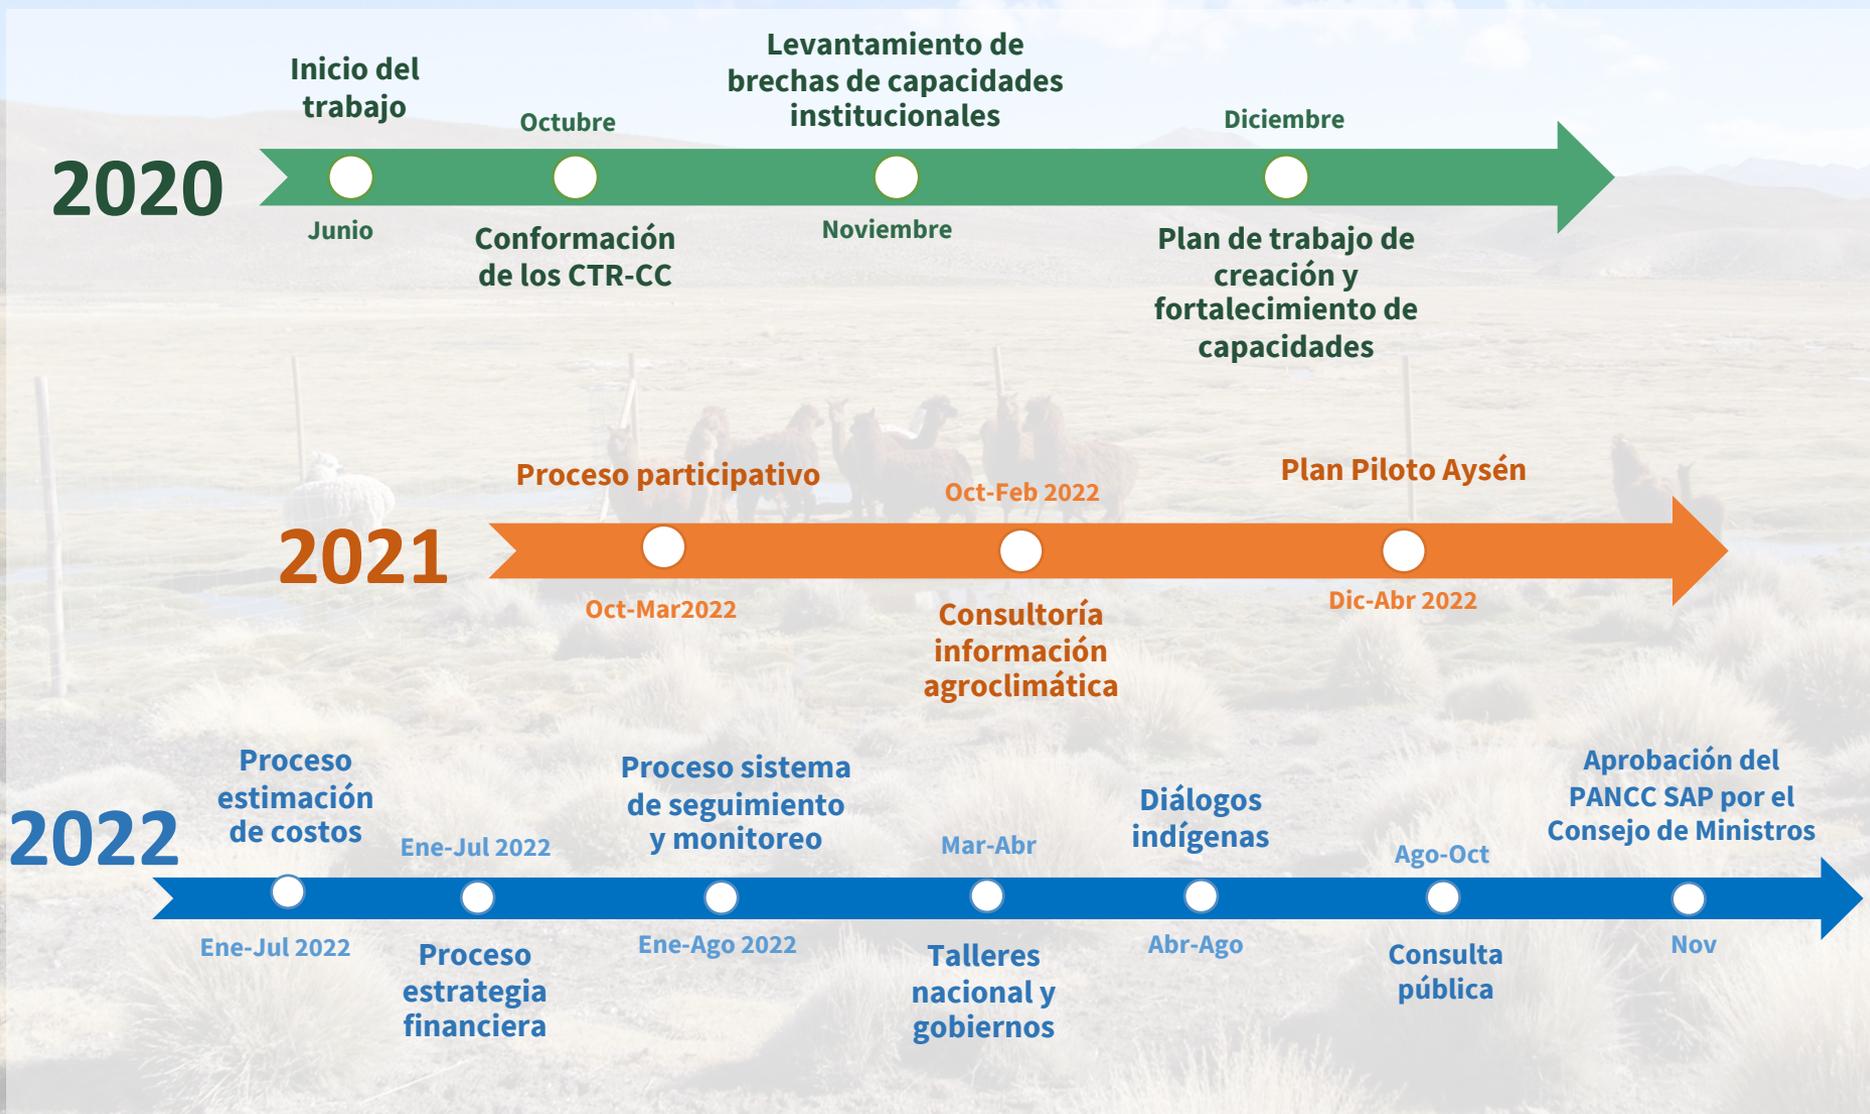



II. Avances 2021



Actividades desarrolladas a Diciembre de 2021

2020

- Lanzamiento del PANCC SAP
- Reuniones con autoridades nacionales y regionales
- Reuniones con UG y AND
- Elaboración de documentos de trabajo
- Coordinación para la conformación de los CTR-CC
- Conformación y reuniones con los CTR-CC
- Licitación Proceso Participativo
- APCA SpA.
- Plan de Capacitación a CTR-CC (2020-2021)

2021

- Reunión con Comité Directivo (aprobación POA 2020-2021)
- Levantamiento de información regional (base de datos e información agroclimática)
- Planificación de los talleres regionales
- Inicio de planificación del proceso de Diálogos Indígenas
- Reuniones con UG y CTR-CC
- Capacitación de facilitadores proceso participativo APCA, WSP
- Revisión de productos APCA SpA.
- Interrupción del contrato APCA SpA.
- Licitación Deuman proceso participativo, no finalizó
- 8 Propuestas de reestructuración PANCC SAP (COVID19)
- Reunión extraord. CD reestructuración del POA2020/21
- Inicio y adjudicación licitación: proceso participativo WSP
- Reestructuración Equipo de Coordinación
- Difusión avances en RRSS y notas de prensa
- Proceso priorización de medidas
- Inicio estudio información agroclimática
- Inicio Plan Piloto Aysén U. Austral
- Jun-Dic : CGIAR/CIAT Biodiversity (género/Info Agrocl)

Ciclo de talleres por región (salvo Aysén)

Macrozona	Región	TIPO DE TALLER	
		Multiactor	Pequeños agricultores
Macrozona Centro Sur	Ñuble	jueves 21 de octubre	02 al 04 noviembre
	Biobío	viernes 22 de octubre	05 al 09 noviembre
	Araucanía	martes 26 de octubre	08 al 10 noviembre
Macrozona Sur	Los Ríos	Martes 30 de noviembre	30 noviembre al 03 diciembre
	Los Lagos	Martes 07 de diciembre	06 al 10 diciembre
	Magallanes	Martes 14 de diciembre	13 dic al 17 diciembre
Macrozona Norte	Arica y Parinacota	martes 4 de enero,	05 , 06 y 07 de enero*
	Tarapacá	jueves 6 de enero,	10, 11 y 12 de enero*
	Antofagasta	martes 11 de enero	12 al 14 de enero
Macrozona Centro Norte	Atacama	martes 18 de enero	Semana del 17 al 21 de enero
	Coquimbo	jueves 27 de enero	Semana del 24 al 28 de enero
	Valparaíso	31 de enero al 04 de febrero	31 de enero al 04 de febrero
Macrozona Centro	Metropolitana	jueves 10 febrero,	Semana del 7 al 11 febrero
	O'Higgins	martes 15 de febrero	Semana del 14 al 18 febrero
	Maule	jueves 24 de febrero	Semana del 21 al 25 febrero

III. Plan operativo anual 2022 (POA)

El POA para efectos de reporte al FVC, se materializa en una Carta Gantt que contiene los resultados, sub-resultados y las respectivas actividades planificadas para el año 2022, de acuerdo a lo establecido en el *Concept note*. Además, requiere de la aprobación del Comité Directivo para su puesta en marcha.

Plan operativo anual 2022 (POA)

Propuesta Re-estructuración en orden cronológico		2022											
Consultor	Proceso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Consultoría 2	Talleres participativos regionales		28-feb										
Consultoría 3	Priorización de medidas, talleres: técnico regionales, nacional y gubernamental												
Consultoría 4	Plan piloto de Aysén												
Consultoría 7	Estimación de costos Estrategia financiera												
Consultoría 8	Seguimiento y monitoreo												
EC o Consultoría 9	Diálogos indígenas												
EC	Consulta ciudadana participativa												
Consultoría 6	Propuesta final PANCC SAP 2023-2027												
Consultoría 5	Información agroclimática												
EC**	Protocolo de actualización del PANCC SAP												
ODEPA	Lanzamiento del PANCC SAP 2023-2027												
	Impresiones PANCC SAP												
	Finalización												04-dic

Plazo adicional



Los resultados de las actividades del año 2021-2022 serán la base del nuevo PANCC SAP, el que será revisado y validado el año 2022.



GREEN
CLIMATE
FUND



www.minagri.gob.cl

www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico
