

# Plan Operativo Anual (POA) 2022-2023

3<sup>a</sup> reunión ordinaria Comité Directivo

**PANCC SAP**

29 agosto 2022




GREEN  
CLIMATE  
FUND





# I. Contexto

# Línea de tiempo PANCC SAP

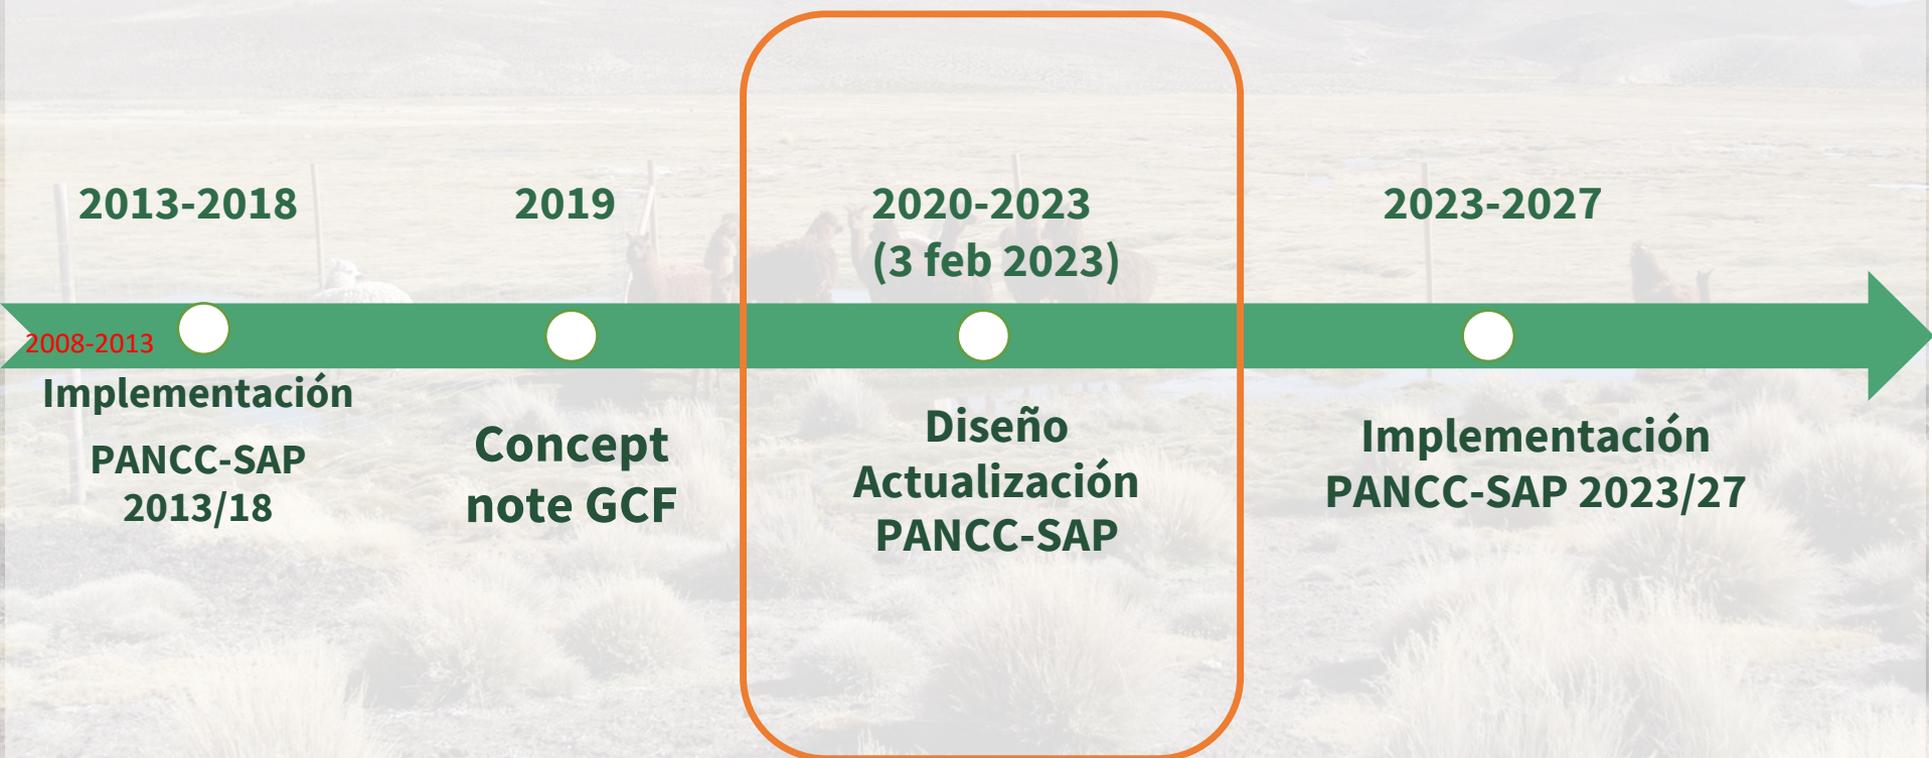

# Diseño PANCC SAP (2020-2023 feb)

## Implementación PANCC SAP 2023-2027

- Monto USD 500.000 readiness GCF mediante postulación (concept note)
- 1er Plan en actualizarse de los 9 planes sectoriales
- Inicio entre proceso oficial GCF (Project agreement) e ingreso real de fondos (4 dic 2019)
- Incorpora y considera:
  - Directrices específicas CMNUCC, GCF, MMA, etc.
  - Lecciones aprendidas PANCC SAP 2013-2018
  - Salvaguardas sociales y ambientales
- Énfasis en la participación de las actorías territoriales
- Foco en la implementación en el territorio - macrozonal

# Etapas del proceso de actualización

## Levantar insumos

Documentos de trabajo  
CTRCC  
Proceso participativo regional


## Priorización

Factibilidad técnica  
Factibilidad medición/cuantificación resultados  
Factibilidad económica y financiera  
CTICC ETICC  
Diálogos indígenas

## Validación

Consulta ciudadana  
Autoridades Minagri  
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático

# Proceso de actualización PANCC SAP

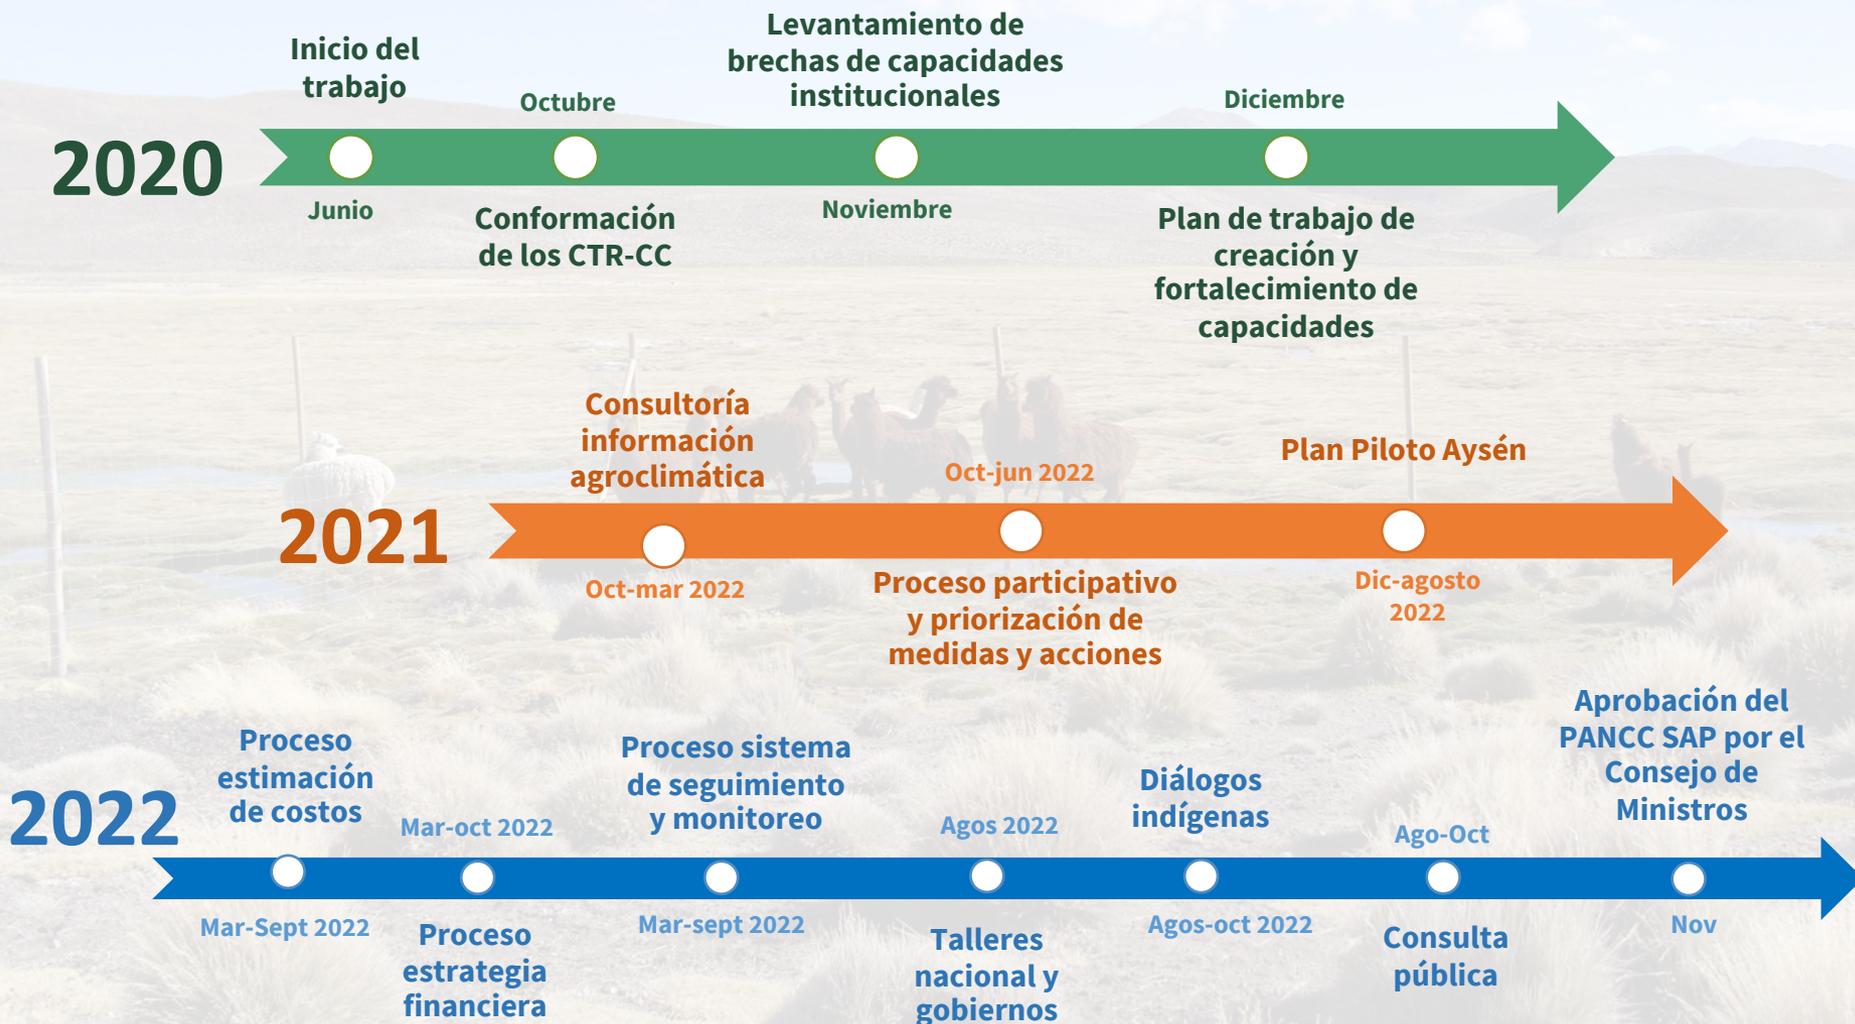



## II. Avances 2022 (a la fecha)

# Principales actividades desarrolladas a agosto de 2020 - 2021

## 2020

- Lanzamiento de la actualización del PANCC SAP
- Reuniones con autoridades nacionales y regionales
- Reuniones con UG y AND
- Elaboración de documentos de trabajo
- Coordinación para la conformación de los CTR-CC
- Conformación y reuniones con los CTR-CC
- Licitación Proceso Participativo
- APCA SpA.
- Plan de Capacitación a CTR-CC (20220-2021)

## 2021

- Comité Directivo (aprobación POA 2020-2021)
- Reuniones UG y CTR-CC
- Reestructuración PANCC SAP por COVID19
- Comité Directivo extraord. reestructuración del POA 2020/21
- Reestructuración Equipo de Coordinación
- Inicio proceso participativo WSP
- Inicio estudio información agroclimática
- Inicio Plan Piloto Aysén U. Austral
- Jun-dic : CGIAR/CIAT Biodiversity (género/Info Agroclimática)
- Otras actividades de planificación, gestión y levantamiento de información para el proyecto

# Principales actividades desarrolladas a agosto de 2022

## Ejecutadas

- Comité Directivo (aprobación POA 2021-2022)
- Reuniones seguimiento:
  - Subcomité, UG, CTR-CC, FAO-ODEPA, NDA, EC
- Estudio información agroclimática
- Análisis vulnerabilidad sector SAP
- Proceso participativo en las 16 regiones del país
- Primera priorización medidas y acciones PANCC SAP (Factibilidad técnica)
- Taller Gubernamental (ETIC y CTICC) y Taller Nacional
- Análisis coherencia medidas y acciones según vulnerabilidad del sector SAP

## En ejecución

- Consultoría análisis costo acción/inacción
- Consultoría estrategia financiera
- Consultoría desarrollo sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del PANCC SAP
- Diálogos Indígenas

# III. Plan operativo anual 2022-2023 (POA)

**El POA para efectos de reporte al FVC, se materializa en una Carta Gantt que contiene los resultados, sub-resultados y las respectivas actividades planificadas para el año en curso, de acuerdo a lo establecido en el *Concept note*. Además, requiere de la aprobación del Comité Directivo para su puesta en marcha.**



# Resumen presupuesto (USD)

Categorías	Planificado	Gastado	No gastado a junio 2022	Comprometido	Disponible
Consultorías	172.315	164.168	8.147	Coordinadora y asistente	
Contratos	204.407	194.182	10.226	Pendientes pagos Tepual y Cambio Global	
Seminarios y capacitaciones	46.022	-	46.022	Diálogos indígenas	4000 USD evento de lanzamiento
Adquisiciones no fungibles	6.000	-	6.000		6000 USD impresiones
Costo de gestión del Proyecto	30.404	27.848	2.555		
Contingencia	1.400	-	1.400		
Fee Agencia Implementadora	39.147	19.362	19.785		
<b>TOTAL</b>	<b>499.695</b>	<b>405.560</b>	<b>94,135.00</b>		



# IV. Aspectos a discutir y consensuar

- Extensión del actual POA 2022 (aprobado febrero 2022), hasta el 3 de febrero de 2023, fecha establecida por el FVC para la finalización de actividades en el marco del proyecto financiado.
- Pendiente, a la espera de los Reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático:
  - ✓ Consulta ciudadana
  - ✓ Aprobación Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
  - ✓ Lanzamiento e impresión
- \* Se requiere comunicación oficial al FVC que justifique la no finalización del proyecto en los términos acordados.
- Se propone realizar un proceso de validación del Anteproyecto, a menor escala, a través de los mecanismos de consulta ciudadana que fija el MINAGRI.
- Como cierre alternativo del proyecto, se propone la realización de un evento de difusión del Anteproyecto resultante.



GREEN  
CLIMATE  
FUND



[www.minagri.gob.cl](http://www.minagri.gob.cl)

[www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico](http://www.odepa.gob.cl/temas-transversales/cambio-climatico)
